

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月18日

計画の名称	東原地区における街なみ環境の向上												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	座間市												
計画の目標	市街地内の散策路として、サクラの植樹、花壇設置、歩道、自転車道を整備することにより、利用する人の散策路歩きを味わうことのできる住民自ら持続可能な景観まちづくりを目指します。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	285	A	285	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)
1	地域住民の利用と、隣接道路の通過交通・事業所利用者・来訪者の視点にも配慮した美化した【仲よし小道】を目指します。 小道づくりを整備・美化することによる次世代のための、サクラ維持管理や花壇維持活動に協働参加する市民団体(自治会等)・事業者等の参加団体率 参加団体率 = 参加団体数 ÷ 想定する東原地区協働参加団体数 市が想定する東原地区協働参加団体数を5団体とする。	20%	60%	100%
2	小道づくりへの住民参加を促進し、愛着のある【仲よし小道】を育てる。また、街なみ環境整備事業によって得られた住民の実感を向上させる。 市民アンケート調査【(仮称)仲よし小道(東原地区)街なみ調査】を行い、【仲よし小道】が整備され、憩いの場となってきたと思う割合 割合 = 憩いの場となってきたと思う人数(15歳以上) ÷ 東原地区の住民数(15歳以上) 対象地区・人数：東原三～五丁目地区 4,820人(H29.4現在)	0%	25%	40%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	座間市	直接	座間市	-	-	東原地区街なみ環境整備 事業	植栽整備、ベンチ整備、遊歩 道・歩道・自転車道の美化 、下排水施設整備、ストリー トファニチャー(分離柵)の 設置	座間市						285	2.02	策定済	
												小計						285		
											合計						285			


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
座間市都市部社会資本総合整備計画に関する評価実施要領に基づき、定量的指標の達成状況について、担当所管にて評価を実施した。	令和5年度
	公表の方法 市のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	整備計画に基づき整備を行い、目標を達成させた。整備を行ったことにより、利用者の満足度向上に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
管理を適切に行うことにより、街なみ環境の維持に努めたい。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	維持管理活動に協働参加する団体・事業者等の参加団体率		
	最終目標値	100%	市ホームページ等において広報に努めたものの、目標値には達しなかった。しかし、市民アンケート調査による結果から、協働参加団体による管理活動によって一定の管理が実施できている。
	最終実績値	80%	
2	市民アンケート調査での憩いの場となってきたと思う割合		
	最終目標値	40%	整備の結果、当初想定以上の満足度であったため。
	最終実績値	73%	

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	東原地区における街なみ環境の向上	交付対象	座間市
計画の期間	平成30年度 ~ 令和4年度 (5年間)		

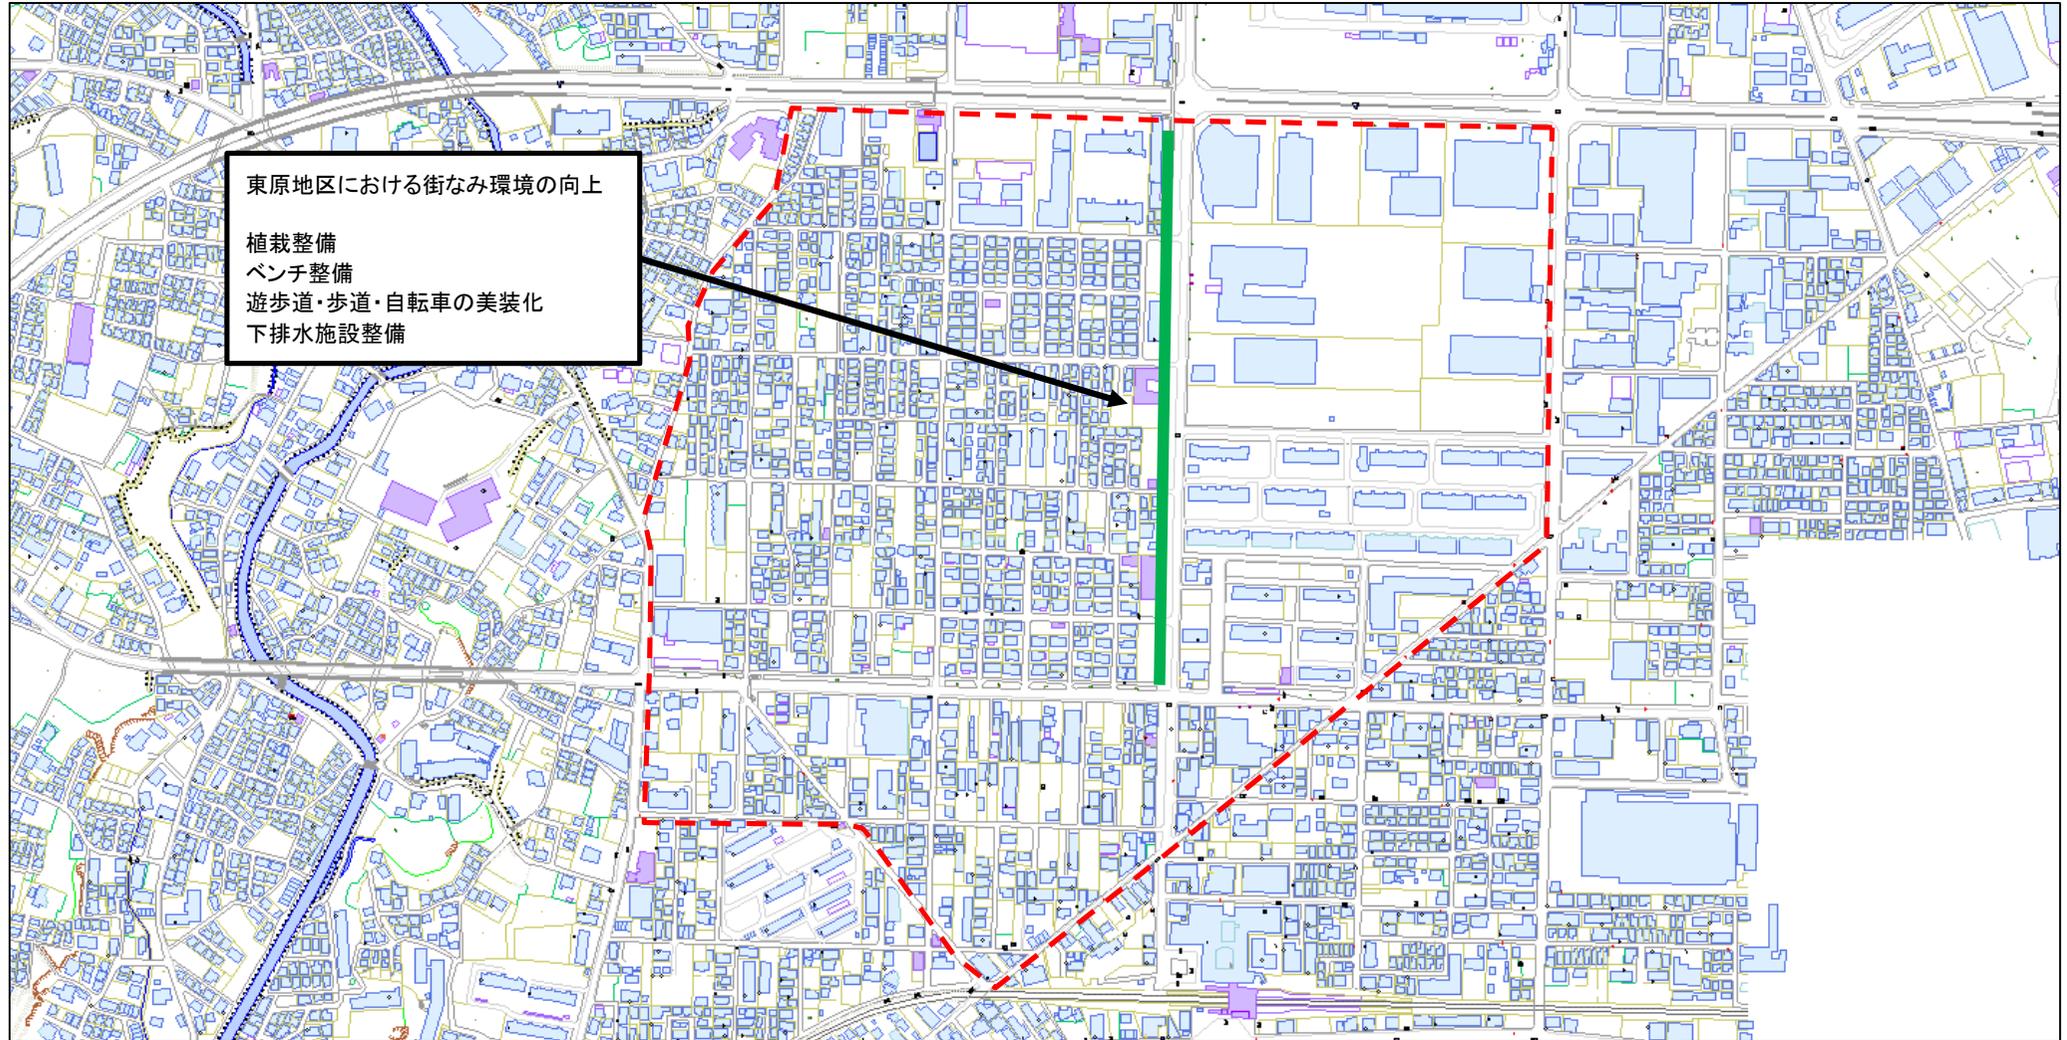

促進区域・事業区域 A=約46.3ha

